

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年3月17日						2019年3月24日					
								日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	
1		启动	6 days	2019年3月18日	2019年3月25日		产品经理[0%]												
2		组建核心团队	1 day	2019年3月18日	2019年3月18日		项目经理												
3		干系人分析	1 day	2019年3月19日	2019年3月19日	2FS+0.5 day	项目经理												
4		里程碑计划	1 day	2019年3月20日	2019年3月20日	3FS+1 day	项目经理												
5		制定项目计划	0.5 days	2019年3月21日	2019年3月21日		项目经理												
6		任命项目管理	0.5 days	2019年3月21日	2019年3月21日		项目经理												
7		确定项目发起人	1 day	2019年3月22日	2019年3月22日		项目经理												
8		项目启动大会	1 day	2019年3月25日	2019年3月25日	2, 3, 4, 5, 6, 7	项目经理												
9		规划	27 days	2019年3月26日	2019年5月1日														
10		规划范围	8 days	2019年3月26日	2019年4月4日														
11		指定需求说明书	1 day	2019年3月26日	2019年3月27日		项目经理												
12		UI设计	2 days	2019年3月28日	2019年3月29日	11	UI/UE设计师												
13		详细设计说明书	0.5 days	2019年4月1日	2019年4月1日	11FS+1 day	项目经理												
14		范围说明书	0.5 days	2019年4月1日	2019年4月2日		项目经理												
15		创建WBS	1 day	2019年4月3日	2019年4月3日	14	项目经理												
16		形成范围基准	1 day	2019年4月4日	2019年4月5日	13, 14, 15	项目经理												
17		规划时间	4 days	2019年4月5日	2019年4月10日														
18		排列工作包顺序	1 day	2019年4月5日	2019年4月5日	16	项目经理												
19		估算资源	1 day	2019年4月8日	2019年4月8日	18	项目经理												
20		估算持续时间	1 day	2019年4月9日	2019年4月9日	19	项目经理												
21		指定进度计划	1 day	2019年4月10日	2019年4月11日	20	项目经理												
22		规划成本	2 days	2019年4月11日	2019年4月12日														
23		项目成本估算	1 day	2019年4月11日	2019年4月12日	21	项目经理												
24		项目预算	1 day	2019年4月12日	2019年4月15日	23	项目经理												
25		规划质量	2.13 day	2019年4月16日	2019年4月17日														
26		制定测试计划	1 day	2019年4月15日	2019年4月16日	24	质量专家												
27		制定测试用例	1 day	2019年4月17日	2019年4月17日	26	质量专家												
28		规划人力资源	2 days	2019年4月18日	2019年4月19日														
29		制定人力资源计划	1 day	2019年4月18日	2019年4月18日	27	项目经理												
30		指定人员配备管理计划	1 day	2019年4月19日	2019年4月22日	29	项目经理												
31		规划沟通	1 day	2019年4月22日	2019年4月22日														
32		指定沟通管理计划	1 day	2019年4月22日	2019年4月23日	30	项目经理												

项目：掌上宝宝 日期：2019年3月28日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年3月17日							2019年3月24日			
								日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三
33		规划风险	4 days	2019年4月23日	2019年4月26日													
34		识别风险	1 day	2019年4月23日	2019年4月24日	32												
35		风险分析	1 day	2019年4月24日	2019年4月25日	34												
36		制定风险登记册	1 day	2019年4月25日	2019年4月25日	35												
37		规划整合	1 day	2019年4月26日	2019年4月29日	36												
38		执行与监控	20 days	2019年4月29日	2019年5月24日													
39		项目执行	11 days	2019年4月29日	2019年5月11日													
40		用户模块	5 days	2019年4月29日	2019年5月3日													
41		注册登录	3 days	2019年4月24日	2019年4月29日	37	程序员1											
42		首页	3 days	2019年4月30日	2019年5月2日	41	程序员1											
43		用户信息	2 days	2019年5月1日	2019年5月2日	42	程序员2											
44		成长树	2 days	2019年5月2日	2019年5月3日	43	程序员2, 程序员											
45		管理员模块	5 days	2019年5月6日	2019年5月10日													
46		用户管理	2 days	2019年5月6日	2019年5月8日	44	程序员1, 程序员											
47		统计分析	2 days	2019年5月8日	2019年5月9日	46	程序员2, 程序员											
48		备份	1 day	2019年5月10日	2019年5月10日	46, 47	程序员4											
49		项目监控	13 days	2019年4月29日	2019年5月15日													
50		各项指标监控	10 days	2019年4月29日	2019年5月10日	41	UI/UE设计师, 测											
51		监控评审	1 day	2019年5月13日	2019年5月14日	50	UI/UE设计师, 测											
52		变更评审	1 day	2019年5月14日	2019年5月14日	51	UI/UE设计师, 测											
53		例会	1 day	2019年5月15日	2019年5月15日	30												
54		管理干系人	1 day	2019年5月15日	2019年5月15日													
55		发布项目信息	1 day	2019年5月15日	2019年5月15日	30	项目经理											
56		报告监控指标	1 day	2019年5月15日	2019年5月15日	30	项目经理											
57		干系人沟通	1 day	2019年5月15日	2019年5月15日	30	项目经理											
58		团队建设	1 day	2019年5月15日	2019年5月15日													
59		培训	1 day	2019年5月15日	2019年5月15日	30	UI/UE设计师, 产											
60		娱乐活动	1 day	2019年5月15日	2019年5月15日	30	UI/UE设计师, 测											
61		沟通	1 day	2019年5月15日	2019年5月15日	30	UI/UE设计师, 测											
62		项目验收	1 day	2020年5月19日	2020年5月20日	30	UI/UE设计师, 测											
63		收尾	3. 13 day	2020年5月20日	2020年5月22日													
64		项目终验	1 day	2020年5月20日	2020年5月21日	62	UI/UE设计师, 测											
65		项目发布	1 day	2020年5月21日	2020年5月22日	64	项目经理											

项目：掌上宝宝

日期：2019年3月28日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间

仅完成时间







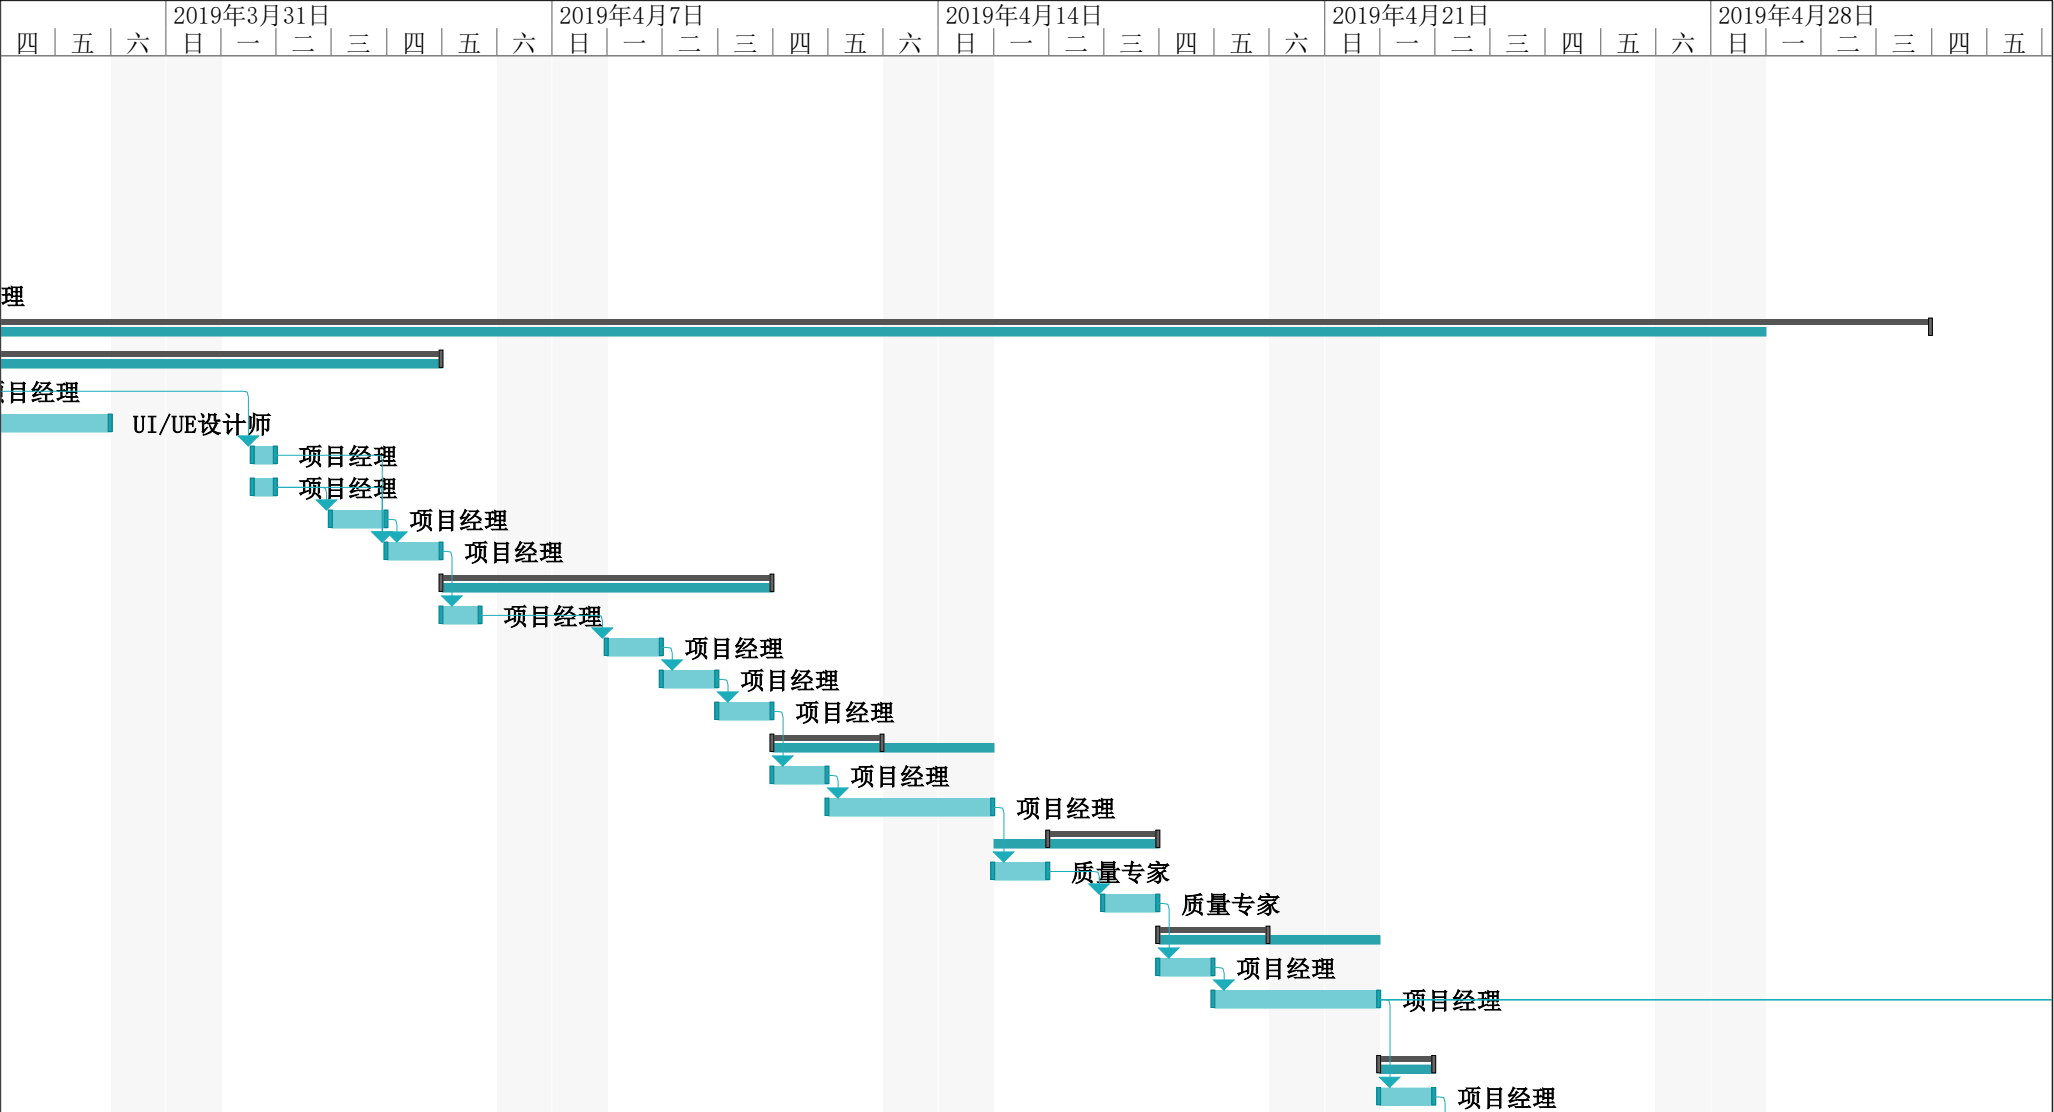












期限


进度

手动进度




项目：掌上宝宝
日期：2019年3月28日

任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

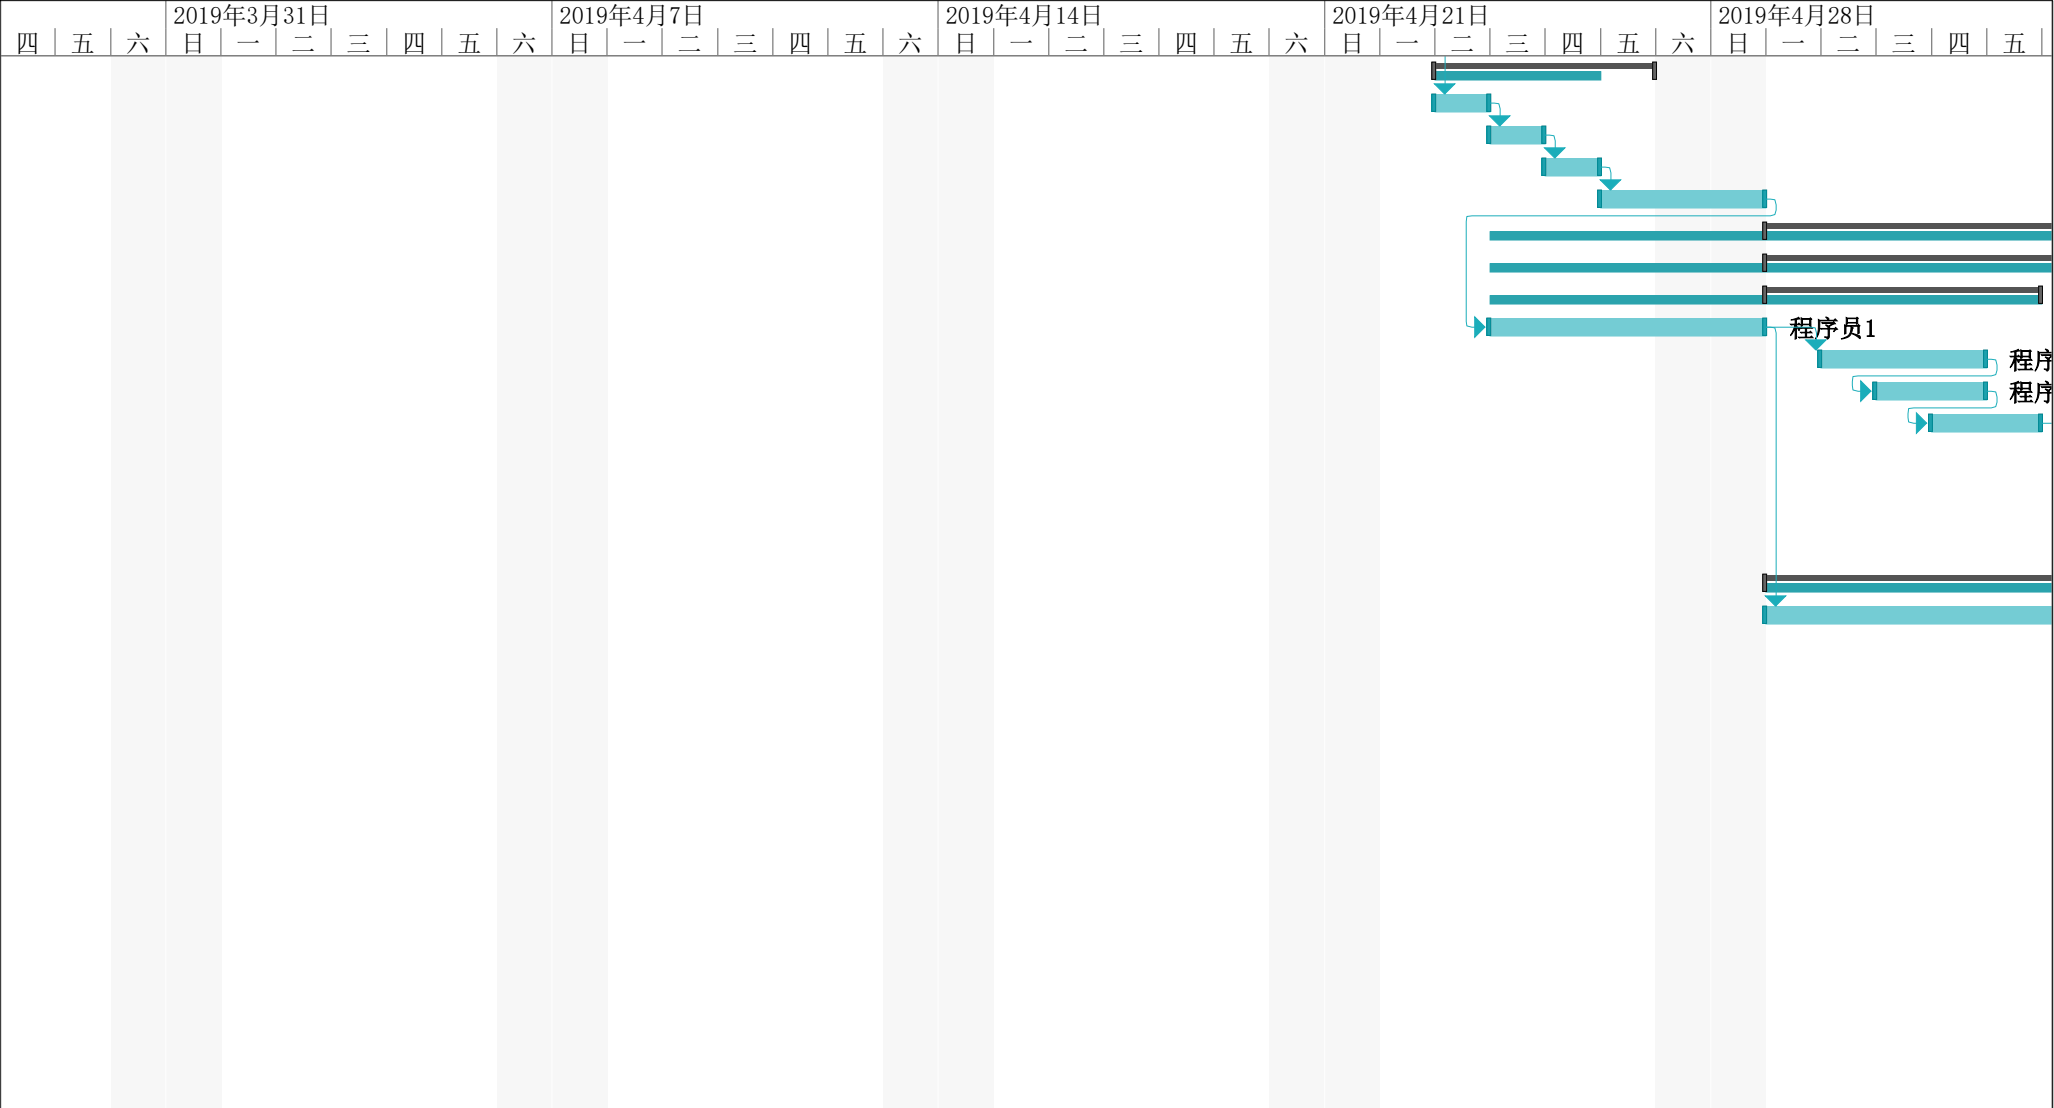

项目：掌上宝宝 日期：2019年3月28日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

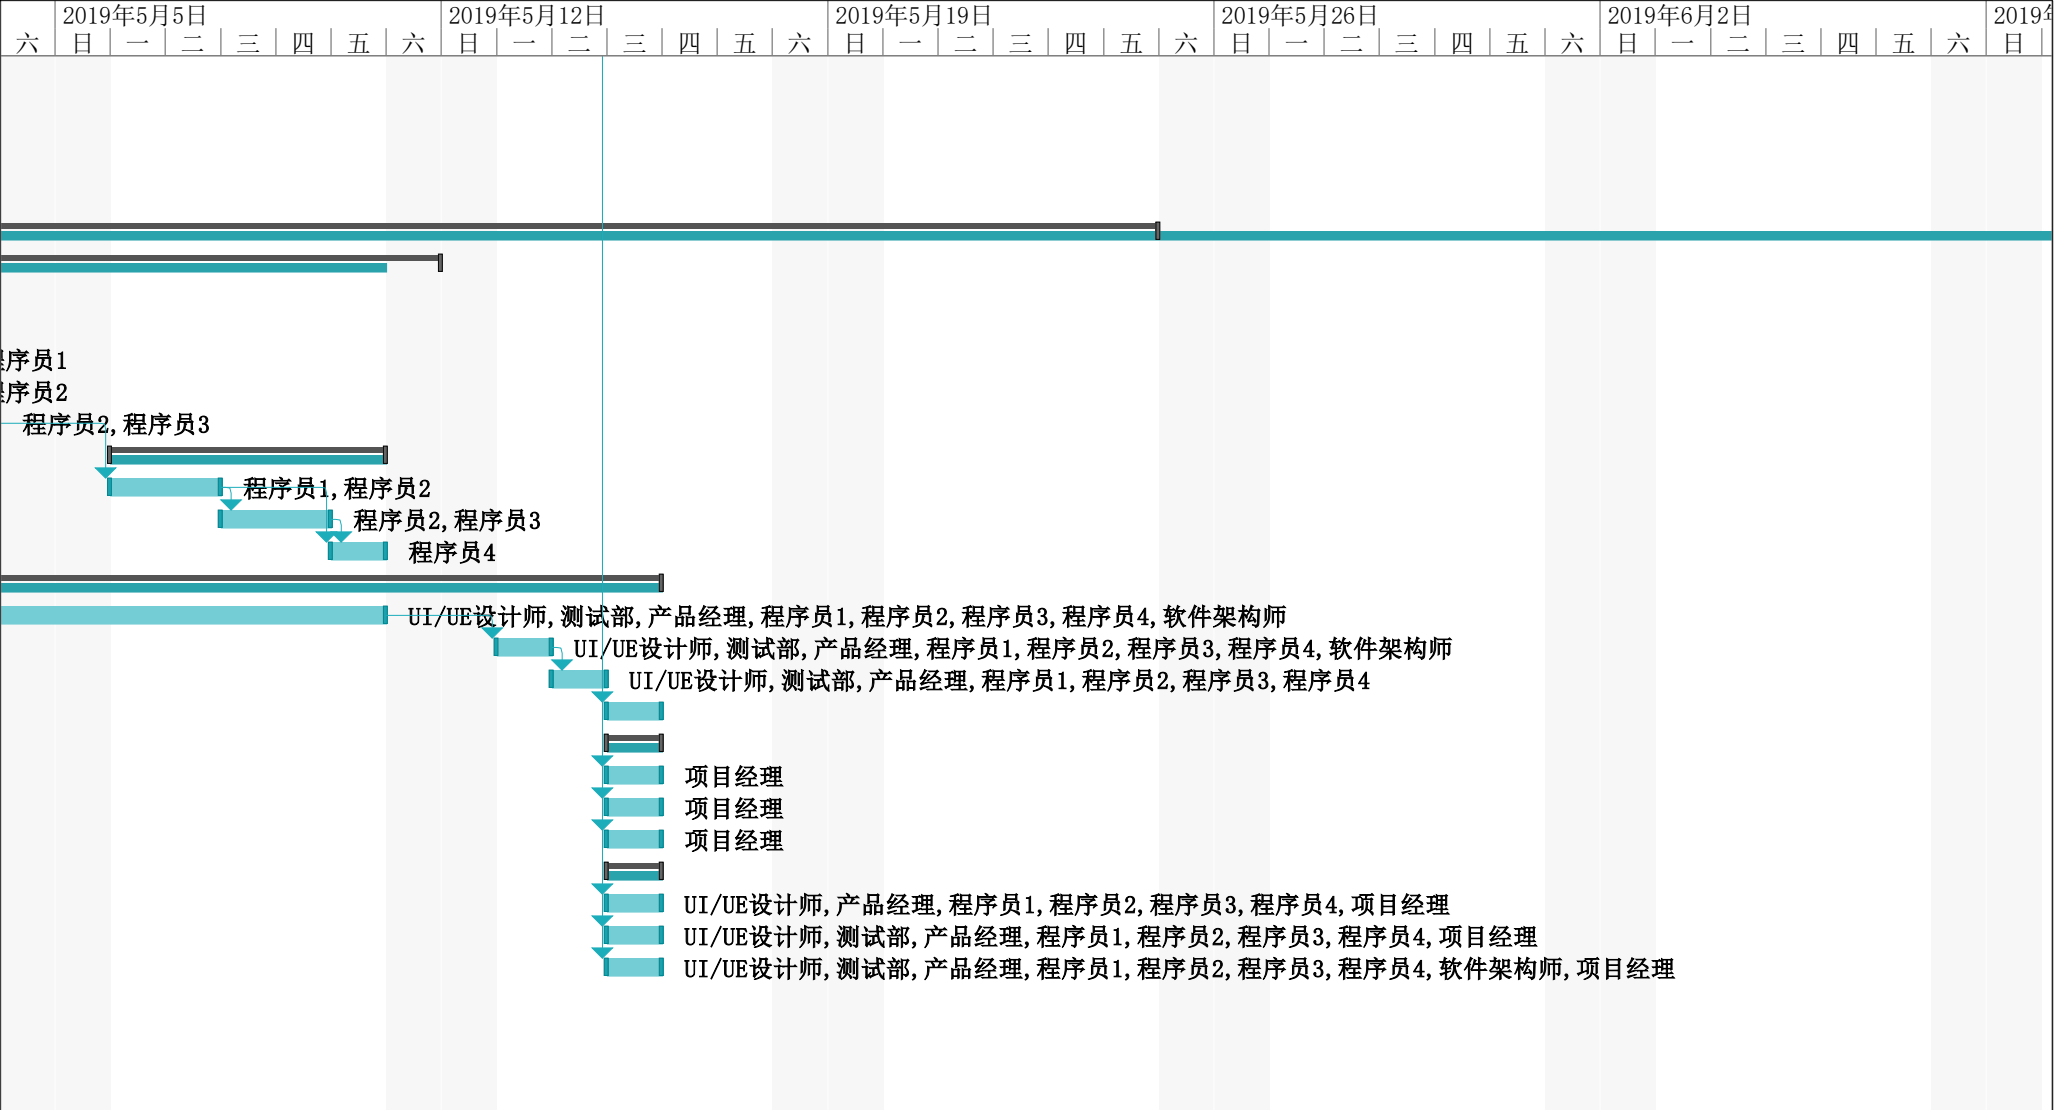

项目：掌上宝宝
日期：2019年3月28日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

2019年5月5日							2019年5月12日							2019年5月19日							2019年5月26日							2019年6月2日							2019年6月9日																																
六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日																																						
项目：掌上宝宝 日期：2019年3月28日							<table><tr><td>任务</td><td></td><td>外部任务</td><td></td><td>手动任务</td><td></td><td>仅完成时间</td><td></td></tr><tr><td>拆分</td><td></td><td>外部里程碑</td><td></td><td>仅工期</td><td></td><td>期限</td><td></td></tr><tr><td>里程碑</td><td></td><td>非活动任务</td><td></td><td>手动摘要总成</td><td></td><td>进度</td><td></td></tr><tr><td>摘要</td><td></td><td>非活动里程碑</td><td></td><td>手动摘要</td><td></td><td>手动进度</td><td></td></tr><tr><td>项目摘要</td><td></td><td>非活动摘要</td><td></td><td>仅开始时间</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					任务		外部任务		手动任务		仅完成时间		拆分		外部里程碑		仅工期		期限		里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度		摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度		项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			
							任务		外部任务		手动任务		仅完成时间																																																						
							拆分		外部里程碑		仅工期		期限																																																						
							里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度																																																						
							摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度																																																						
项目摘要		非活动摘要		仅开始时间																																																															
第 9 页																																																																			
